

# **DÜZCE**

**DSİ 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ  
(ANKARA)**

**2017 YILI YATIRIMLARI  
(18 Proje)**

**2018**

<b>SIRA NO</b>	<b>PROJE ADI</b>	<b>DURUMU</b>
1	Akçakoca Barajı İçmesuyu İsale Hattı	Tamamlandı
2	Akçakoca Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisi	Devam ediyor
3	Akçakoca İçmesuyu Tesisleri Scada Otomasyon Sistemi Kurulması	Devam ediyor
4	Akçakoca Altunçay Göleti	İhale aşamasında
5	Akçakoca İlçe Merkezi Orhanlı, Haciz ve Sarma Dereleri İkmali	Tamamlandı
6	Çilimli Yenivakıf Göleti	Devam ediyor
7	Çilimli İlçe Merkezi Karadere ve Akdere Taşkın ve Rusubat Kontrolü	Devam ediyor
8	Asarsuyu Deresi Islahı 2. Kısım	İhale aşamasında
9	Küçük Melen Çayı Islahı 2. Kısım	Tamamlandı
10	Büyük Melen Çayı Islahı 2. Kısım	Tamamlandı
11	Merkez Fındıklı Aksu Köyü Aksu Deresi Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı	Proje aşamasında
12	Karacahacımusası Deresi Mansap Kısmı Islahı	Devam ediyor
13	Düzce İli Dereleri Üzerindeki Sanat Yapılarının Yapımı ve Rehabilitasyonu	Devam ediyor
14	Efteni Gölü Islahı	Devam ediyor
15	Kaynaşlı İlçe Merkezi Yandereleri 2. Kısım	Devam ediyor
16	Uğursuyu Göleti	Proje aşamasında
17	Yığılca İlçe Merkezi Dereleri Üst Havza Tedbirleri	Devam ediyor
18	Koçyazı Mahallesi Dere Islahı 2. Kısım	İhale aşamasında

## YATIRIM BİLGİ FORMU

**Projenin Adı** : Akçakoca Barajı İçmesuyu İsale Hattı

**Projenin Yeri** : Düzce / Akçakoca

**Başlama-Bitiş Tarihi** : 24.06.2015 – 30.04.2016

**Proje Bedeli** : 3.491.951 TL

**İhale Bedeli** : 2.945.000 TL


**Önceki Yıllar Harcaması** : 3.301.966 TL

**2017 Yılı Ödeneği** : 55 TL

**2017 Yılı Harcaması** : -

**Fiziki Gerçekleşmesi** : % 100

**Projenin Son Durumu** : 7.000 m HDPE boru döşenmiş, 11 adet sanat yapısı tamamlanmıştır. İşin, geçici kabulü yapılmıştır.

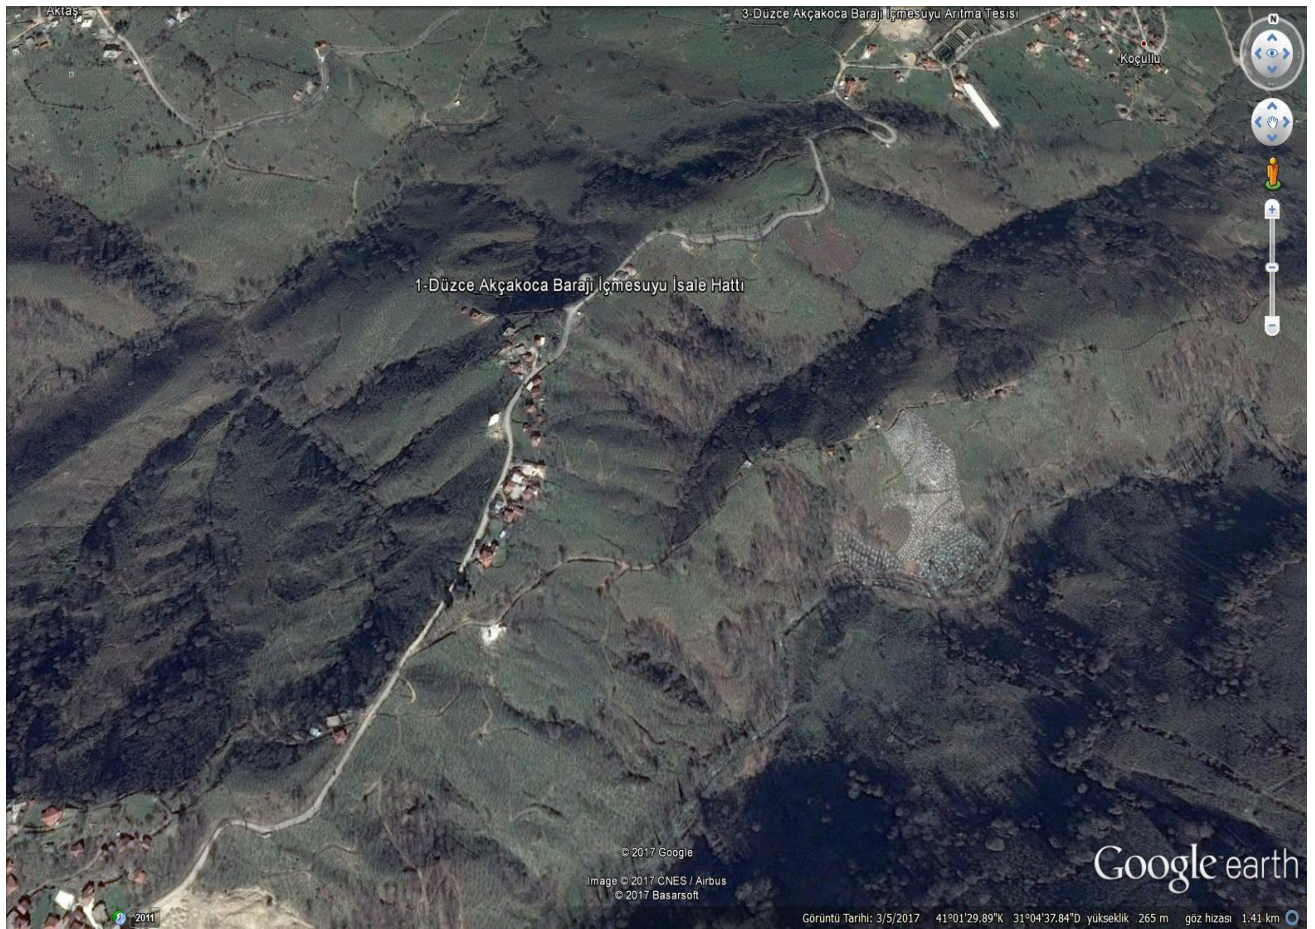







## YATIRIM BİLGİ FORMU

**Projenin Adı** : Akçakoca Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisi

**Projenin Yeri** : Düzce / Akçakoca

**Başlama-Bitiş Tarihi** : 10.08.2016 – 09.08.2018

**Proje Bedeli** : 20.193.627 TL

**İhale Bedeli** : 16.195.000 TL

**Önceki Yıllar Harcaması** : 530.621 TL

**2017 Yılı Ödeneği** : 6.707.945 TL

**2017 Yılı Harcaması** : 6.707.945 TL

**Fiziki Gerçekleşmesi** : % 35

**Projenin Son Durumu** : Arıtma tesisine ait idari bina, ısı merkezi, trafo binası, hava körükleri odası, makine bloğu, temiz su deposu ve manevra odasının kaba inşaatları tamamlanmıştır. Hızlı ve yavaş karıştırıcı, durultucu, belt pres yapılarının temel imalatları tamamlandı.







## YATIRIM BİLGİ FORMU

**Projenin Adı** : Akçakoca İçmesuyu Tesisleri Scada Otomasyon Sistemi Kurulması

**Projenin Yeri** : Düzce / Akçakoca

**Başlama-Bitiş Tarihi** : 22.09.2017 – 20.04.2018

**Proje Bedeli** : 580.560 TL

**İhale Bedeli** : 492.000 TL

**Önceki Yıllar Harcaması** : -

**2017 Yılı Ödeneği** : 100.000 TL

**2017 Yılı Harcaması** : -

**Fiziki Gerçekleşmesi** : % 1

**Projenin Son Durumu** : Proje kapsamında mevcut depoların ve içmesuyu tesislerine ilişkin bakiye klor bilgilerinin Belediye Binasında kurulacak olan SCADA Merkezi'nden izlenmesi, kontrol edilmesi ve veri depolamanın sağlanması, ayrıca Merkez Arıtma Tesisinden izlenmesi için gerekli imalatların yapılmasıdır. 22.09.2017 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır.



## YATIRIM BİLGİ FORMU

<b>Projenin Adı</b>	<b>: Akçakoca Altunçay Göleti</b>
Projenin Yeri	: Düzce / Akçakoca
Başlama-Bitiş Tarihi	: 2017 - 2019
Proje Bedeli	: 12.000.000 TL
İhale Bedeli	: -
Önceki Yıllar Harcaması	: -
2017 Yılı Ödeneği	: 1.000 TL
2017 Yılı Harcaması	: -
Fiziki Gerçekleşmesi	: -
Projenin Son Durumu	: İhale aşamasında





## YATIRIM BİLGİ FORMU

**Projenin Adı** : Akçakoca İlçe Merkezi Orhanlı, Haciz ve Sarma Dereleri İkmali

**Projenin Yeri** : Düzce / Akçakoca

**Başlama-Bitiş Tarihi** : 26.02.2016 – 30.06.2017

**Proje Bedeli** : 3.155.979 TL

**İhale Bedeli** : 2.625.978 TL

**Önceki Yıllar Harcaması** : 1.967.521 TL

**2017 Yılı Ödeneği** : 1.401.439 TL

**2017 Yılı Harcaması** : 1.401.438 TL

**Fiziki Gerçekleşmesi** : % 100

**Projenin Son Durumu** : İş tamamlanmış olup, geçici kabule hazır haldedir.









## YATIRIM BİLGİ FORMU

<b>Projenin Adı</b>	<b>: Çilimli Yenivakıf Göleti</b>
Projenin Yeri	: Düzce / Çilimli
Başlama-Bitiş Tarihi	: 2017 - 2019
Proje Bedeli	: 12.169.340 TL
İhale Bedeli	: 10.313.000 TL
Önceki Yıllar Harcaması	: -
2017 Yılı Ödeneği	: 1.000 TL
2017 Yılı Harcaması	: -
Fiziki Gerçekleşmesi	: % 1
Projenin Son Durumu	: 05.01.2018 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır.





## YATIRIM BİLGİ FORMU

**Projenin Adı** : Çilimli İlçe Merkezi Karadere ve Akdere Taşkın ve Rusubat Kontrolü

**Projenin Yeri** : Düzce / Çilimli

**Başlama-Bitiş Tarihi** : 2017- 2018

**Proje Bedeli** : 881.597 TL

**İhale Bedeli** : 747.116 TL

**Önceki Yıllar Harcaması** : -

**2017 Yılı Ödeneği** : -

**2017 Yılı Harcaması** : -

**Fiziki Gerçekleşmesi** : % 1


**Projenin Son Durumu** : 09.01.2018 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır.





## YATIRIM BİLGİ FORMU

<b>Projenin Adı</b>	<b>: Asarsuyu Deresi Islahı 2. Kısım</b>
Projenin Yeri	: Düzce / Merkez
Başlama-Bitiş Tarihi	: 2018 - 2019
Proje Bedeli	: 15.000.000 TL
İhale Bedeli	: -
Önceki Yıllar Harcaması	: -
2017 Yılı Ödeneği	: -
2017 Yılı Harcaması	: -
Fiziki Gerçekleşmesi	: -
Projenin Son Durumu	: İhale aşamasında

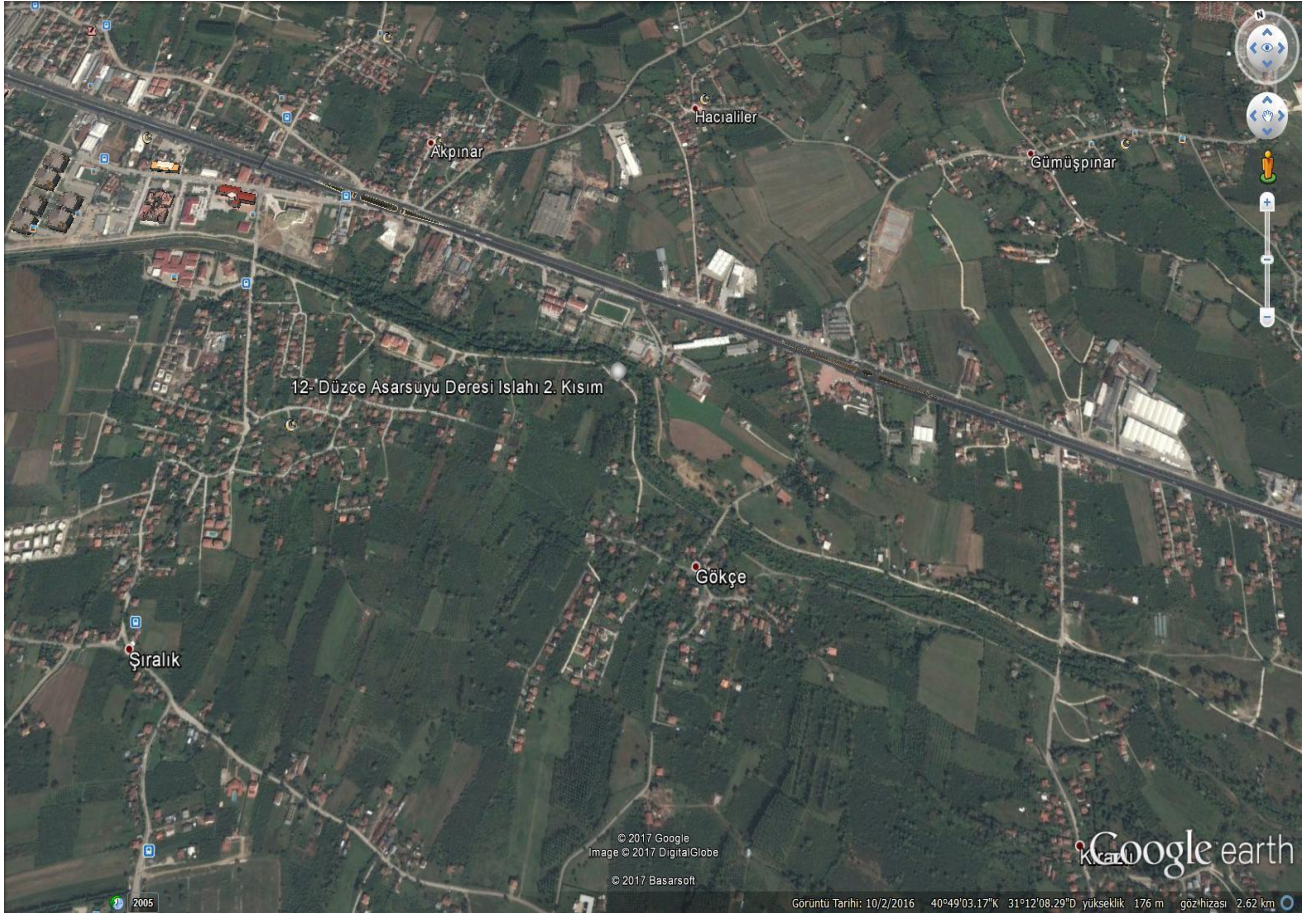



## YATIRIM BİLGİ FORMU

**Projenin Adı** : Küçük Melen Çayı Islahı 2. Kısım

**Projenin Yeri** : Düzce / Merkez

**Başlama-Bitiş Tarihi** : 08.09.2016 – 01.12.2017

**Proje Bedeli** : 8.913.218 TL

**İhale Bedeli** : 7.513.218 TL

**Önceki Yıllar Harcaması** : 2.066.990 TL

**2017 Yılı Ödeneği** : 6.649.018 TL

**2017 Yılı Harcaması** : 6.649.018 TL

**Fiziki Gerçekleşmesi** : % 100

**Projenin Son Durumu** : Küçük Melen çayında Km: 9+800- 10+840 ile 11+600-14+073 arası taş tahkimat işleri tamamlanmıştır.









## YATIRIM BİLGİ FORMU

**Projenin Adı** : Büyük Melen Çayı Islahı 2. Kısım

**Projenin Yeri** : Düzce / Muhtelif (Gölyaka – Cumayeri)

**Başlama-Bitiş Tarihi** : 25.08.2015 – 18.08.2017

**Proje Bedeli** : 8.044.200 TL

**İhale Bedeli** : 6.644.200 TL

**Önceki Yıllar Harcaması** : 6.810.868 TL

**2017 Yılı Ödeneği** : 1.023.832 TL

**2017 Yılı Harcaması** : 1.023.748 TL

**Fiziki Gerçekleşmesi** : % 100

**Projenin Son Durumu** : Büyük Melen Çayında 6.100 m taş tahkimat yapılmıştır. İş geçici kabule hazır haldedir.









## YATIRIM BİLGİ FORMU

**Projenin Adı** : **Merkez Fındıklı Aksu Köyü Aksu Deresi Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı**

**Projenin Yeri** : Düzce / Merkez / Fındıklı Aksu Köyü

**Başlama-Bitiş Tarihi** : 2017 - 2018

**Proje Bedeli** : 500.000 TL

**İhale Bedeli** : -

**Önceki Yıllar Harcaması** : -

**2017 Yılı Ödeneği** : -

**2017 Yılı Harcaması** : -

**Fiziki Gerçekleşmesi** : -

**Projenin Son Durumu** : Proje işleri tamamlandıktan sonra inşaat ihalesi yapılacaktır.





## YATIRIM BİLGİ FORMU

**Projenin Adı** : Karacahacımusa Deresi Mansap Kısmı Islahı

**Projenin Yeri** : Düzce / Merkez

**Başlama-Bitiş Tarihi** : 14.03.2014 – 23.04.2017

**Proje Bedeli** : 5.948.820 TL

**İhale Bedeli** : 4.793.574 TL

**Önceki Yıllar Harcaması** : 5.045.536 TL

**2017 Yılı Ödeneği** : 603.625 TL

**2017 Yılı Harcaması** : 603.624 TL

**Fiziki Gerçekleşmesi** : % 95

**Projenin Son Durumu** : 2 adet betonarme araç köprüsü ve 4.500 m tek taraflı kargir taşkın koruma duvarı imalatı tamamlandı. Devam ediyor.









## YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı	: Düzce İli Dereleri Üzerindeki Sanat Yapılarının Yapımı ve Rehabilitasyonu
Projenin Yeri	: Düzce / Merkez / Beyköy
Başlama-Bitiş Tarihi	: 2017 - 2018
Proje Bedeli	: 7.537.435 TL
İhale Bedeli	: 6.387.674 TL
Önceki Yıllar Harcaması	: -
2017 Yılı Ödeneği	: -
2017 Yılı Harcaması	: -
Fiziki Gerçekleşmesi	: % 1
Projenin Son Durumu	: 29.12.2017 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır





## YATIRIM BİLGİ FORMU

<b>Projenin Adı</b>	<b>: Efteni Gölü Islahı</b>
Projenin Yeri	: Düzce / Gölyaka
Başlama-Bitiş Tarihi	: 2017 - 2020
Proje Bedeli	: 37.573.560 TL
İhale Bedeli	: 31.842.000 TL
Önceki Yıllar Harcaması	: -
2017 Yılı Ödeneği	: 1.000 TL
2017 Yılı Harcaması	: -
Fiziki Gerçekleşmesi	: % 1
Projenin Son Durumu	: 24.11.2017 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır.





## YATIRIM BİLGİ FORMU

<b>Projenin Adı</b>	<b>: Kaynaşlı İlçe Merkezi Yandereleri 2. Kısım</b>
Projenin Yeri	: Düzce / Kaynaşlı
Başlama-Bitiş Tarihi	: 2017 - 2019
Proje Bedeli	: 12.535.140 TL
İhale Bedeli	: 10.623.000 TL
Önceki Yıllar Harcaması	: -
2017 Yılı Ödeneği	: 500 TL
2017 Yılı Harcaması	: -
Fiziki Gerçekleşmesi	: % 1
Projenin Son Durumu	: 22.11.2017 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır.





## YATIRIM BİLGİ FORMU

<b>Projenin Adı</b>	<b>: Uğursuyu Göleti</b>
Projenin Yeri	: Düzce / Merkez / Beyköy
Başlama-Bitiş Tarihi	: 2017 - 2019
Proje Bedeli	: 40.000.000 TL
İhale Bedeli	: -
Önceki Yıllar Harcaması	: -
2017 Yılı Ödeneği	: -
2017 Yılı Harcaması	: -
Fiziki Gerçekleşmesi	: -
Projenin Son Durumu	: Proje yapımı devam etmektedir.





## YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı	: Yığılca İlçe Merkezi Dereleri Üst Havza Tedbirleri
Projenin Yeri	: Düzce / Yığılca
Başlama-Bitiş Tarihi	: 2017 - 2019
Proje Bedeli	: 4.983.140 TL
İhale Bedeli	: 4.223.000 TL
Önceki Yıllar Harcaması	: -
2017 Yılı Ödeneği	: 500 TL
2017 Yılı Harcaması	: -
Fiziki Gerçekleşmesi	: % 1
Projenin Son Durumu	: 18.01.2018 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır.





## YATIRIM BİLGİ FORMU

**Projenin Adı** : Koçyazı Mahallesi Dere Islahı 2. Kısım

Projenin Yeri : Düzce / Merkez

Başlama-Bitiş Tarihi : 2018 - 2019

Proje Bedeli : 4.300.000 TL

İhale Bedeli : -

Önceki Yıllar Harcaması : -

2017 Yılı Ödeneği : -

2017 Yılı Harcaması : -

Fiziki Gerçekleşmesi : -

Projenin Son Durumu : İhale aşamasında
