

DÜZCE

**KARAYOLLARI 4. BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
(ANKARA)**

**2017 YILI YATIRIMLARI
(11 Proje)**

2018

SIRA NO	PROJE ADI	DURUMU
1	Adapazarı – Karasu – Akçakoca Yolu Akçakoca – 1. Bölge Hududu Yolu BY BSK	İhalesi Planlanan
2	(Düzce – Akçakoca) Ayrım – Yiğilca Yolu	Devam ediyor
3	Bolu Dağı Geçişi	Tamamlandı
4	Konuralp Köprüleri (Üskübü, Roma Köprüleri) (Tarihi Köprü Onarımı)	İhalesi yapıldı
5	Küçük Melen Köprüsü (Hendek-Düzce Yolunda)	Tamamlandı
6	Merveağzı Köprüsü (Düzce-Akçakoca-Ereğli Yolunda)	Tamamlandı
7	Üskübü Melen Köprüsü (Akçakoca-Ereğli) Ayrımı-Düzce Yolunda	Devam ediyor
8	Gümüşova - Gerede Otoyolu Deprem Kalıcı Konut Alanları Bağlantı Yolları Düzce Otoyol Bağlantı Yolu(İKMAL İŞİNİN Adı Gümüşova-Gerede Otoyolu İle D100 Üzeri Kervan Kavşağı Arası (4+270-8+500) Otoyol Bağlantı Yolu Yapım İşi)	Devam ediyor
9	Anadolu Otoyolu'nun Abant Kavşağı - 1. Bölge Müd. Hud. Arası Muhtelif Km'lerde Üstyapı İyileştirilmesi ve Büyük Onarım Yapım İşi	Tamamlandı
10	Anadolu Otoyolu Gerede Kavşağı - Karayolları 1. Böl. Müd. Hud. Arası Muhtelif Kesimler ile Kavşak Kolları ve Bağlantı Yollarında Üstyapı İyileştirmesi	Devam ediyor
11	Gümüşova - Gerede Otoyolu'nda Düzce Kavşağı (Km: 8 + 738) ve Kaynaşlı Kavşağında (Km: 29 + 570) Kavşak Kolu Genişletilmesi, Köprülü Kavşak Yapılması İşi	Devam ediyor

YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı : Adapazarı – Karasu – Akçakoca Yolu
Akçakoca – 1. Bölge Hududu Yolu BY BSK

Projenin Yeri : Düzce / Akçakoca / Melenagzı

Başlama - Bitiş Tarihi : 2018 - 2020

Projenin Bedeli : 950.000.000 TL

İhale Bedeli : -

Önceki Yıllar Harcaması : -


2017 Yılı Ödeneği : -

2017 Yılı Harcaması : -

Fiziki Gerçekleşmesi : -

Projenin Son Durumu : Akçakoca-Melenagzı-1. Bl. Hd. Yolu Karadeniz'in Marmara'ya bağlantısını sağlayan Karadeniz Sahil Yolunun bir bölümünü içermektedir. Güzergâh üzerinde 23 Km'lik Bitümlü Sıcak Karışımli Bölünmüş Yol yapılacak olup etüt-proje çalışmaları devam etmektedir.

Proje kapsamında 8 adet kavşak, aks uzunluğu $11.685 \times 2 = 23.370$ m olan 11 adet Çift Tüp Tünel ve aks uzunluğu $1.1370 \times 2 = 2.2740$ m olan 11 adet çift köprü yapılması planlanmaktadır. Etüt Proje çalışmalarının 2018 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.

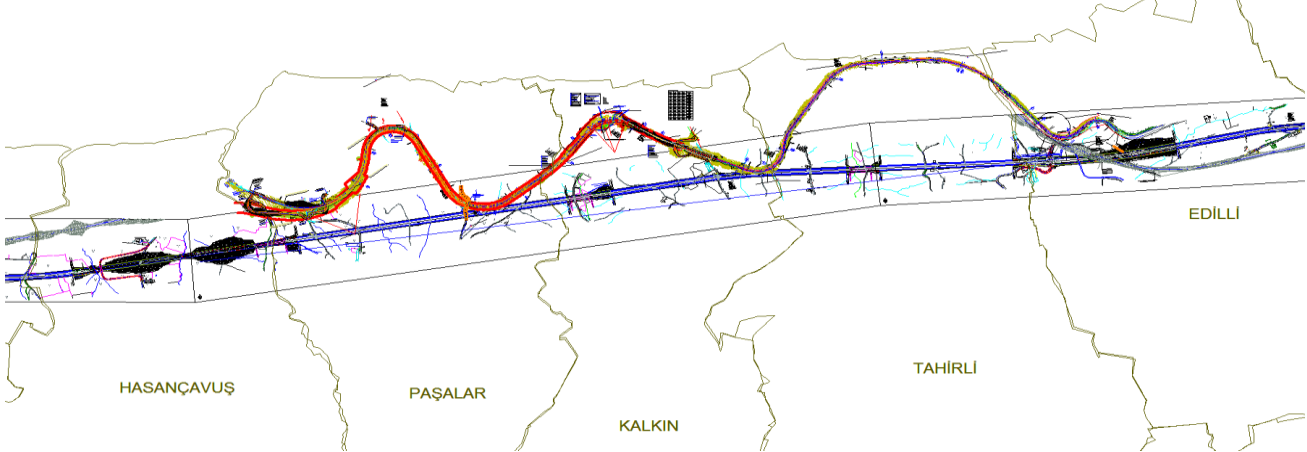

YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı : (Düzce – Akçakoca) Ayrım – Yiğilca Yolu

Projenin Yeri : Düzce / Yiğilca

Başlama - Bitiş Tarihi : 2017 - 2020

Projenin Bedeli : 124.665.000 TL

İhale Bedeli : 83.516.772 TL


Önceki Yıllar Harcaması : -

2017 Yılı Ödeneği : -

2017 Yılı Harcaması : -

Fiziki Gerçekleşmesi : -

Projenin Son Durumu : Düzce – Yiğilca Yolu Proje uzunluğu 17 Km olup TY BSK'dır. Mart 2017'de ihalesi yapılmış olup Temmuz 2017 itibarı ile yer teslimi yapılmıştır. Proje bünyesinde toplam uzunluğu 430 m olan 3 adet viyadük, (Düzce – Akçakoca)Ayrım – Yiğilca arası (Km 11+000 / 18+000) 7 Km TY BSK ve Yiğilca – Alaplı arası (Km: 19+000/28+000) 9 Km TY BSK yapımı yer almakta olup, 2018 yılı itibarı ile TY-BSK çalışmalarına başlanmıştır.

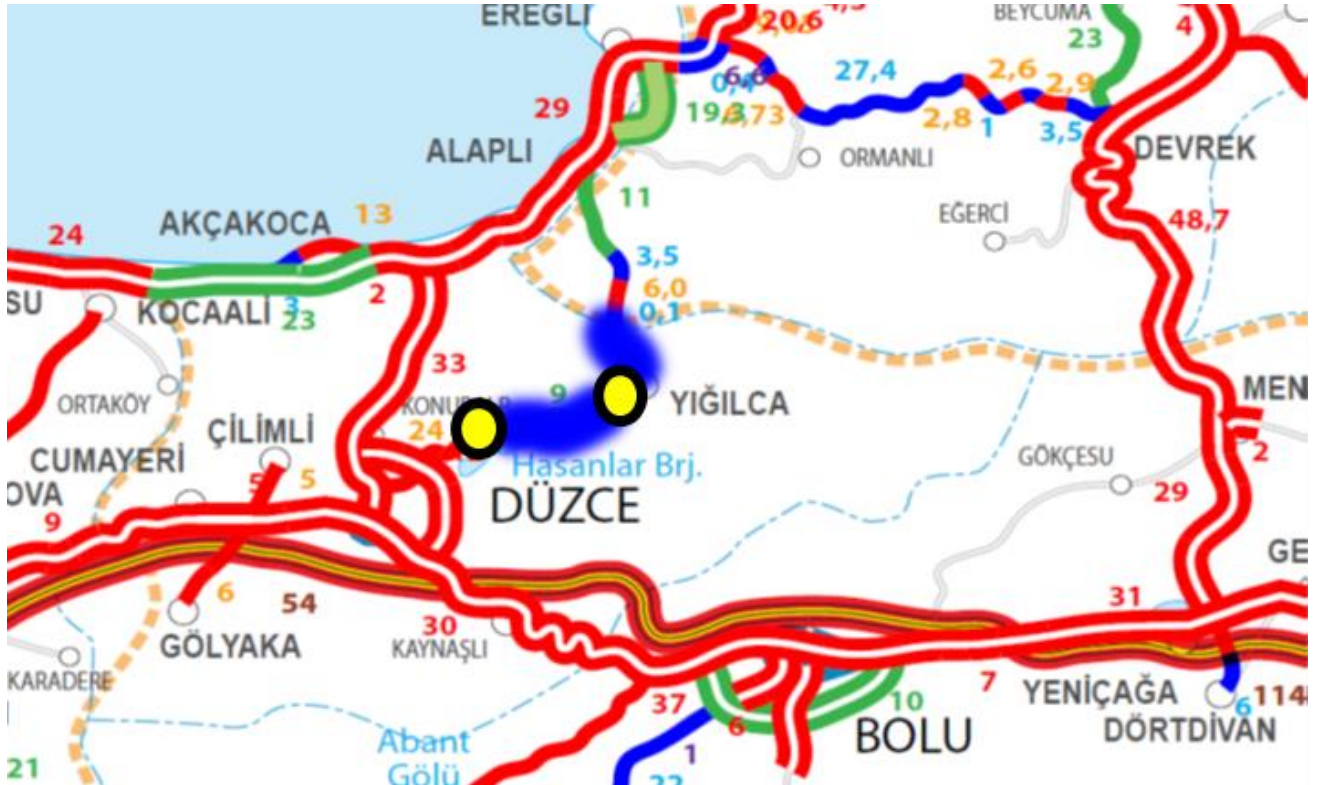

YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı : Bolu Dağı Geçişi

Projenin Yeri : Bolu - Düzce

Başlama - Bitiş Tarihi : 2014 - 2017

Projenin Bedeli : 80.000.000 TL

İhale Bedeli : 39.619.530 TL

Önceki Yıllar Harcaması : 70.310.000 TL

2017 Yılı Ödeneği : 5.000.000 TL

2017 Yılı Harcaması : 7.760.000 TL

Fiziki Gerçekleşmesi : % 98

Projenin Son Durumu : Proje yol uzunluğu 33 Km olan yolu Bolu ili uzunluğu 16 Km, Düzce ilindeki uzunluğu 17 Km'dir. 2017 yılında 1 Km BY BSK onarımı, 7 Km BY-Aşınma ile Hayrettin Tokadi ve Dağkent Kavşaklarında çalışmalar tamamlanmıştır. 2017 yıl sonu itibari ile 33 Km BY BSK Onarımı tamamlanmış olup, işin geçici kabulü yapılmıştır.



YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı	: Konuralp Köprüleri (Üskübü, Roma Köprüleri) (Tarihi Köprü Onarımı)
Projenin Yeri	: Düzce / Merkez
Başlama - Bitiş Tarihi	: 2014 - 2020
Projenin Bedeli	: 100.000 TL
İhale Bedeli	: -
Önceki Yıllar Harcaması	: -
2017 Yılı Ödeneği	: 30.000 TL
2017 Yılı Harcaması	: -
Fiziki Gerçekleşmesi	: -
Projenin Son Durumu	: İhalesi yapıldı

YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı	: Küçük Melen Köprüsü (Hendek-Düzce Yolunda)
Projenin Yeri	: Düzce / Muhtelif
Başlama - Bitiş Tarihi	: 2015 - 2018
Projenin Bedeli	: 3.000.000 TL
İhale Bedeli	: -
Önceki Yıllar Harcaması	: 4.000 TL
2017 Yılı Ödeneği	: 2.807.085 TL
2017 Yılı Harcaması	: 2.807.085 TL
Fiziki Gerçekleşmesi	: % 100
Projenin Son Durumu	: Tamamlandı

YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı	: Merveağı Köprüsü (Düzce-Akçakoca-Ereğli Yolunda)
Projenin Yeri	: Düzce / Muhtelif
Başlama - Bitiş Tarihi	: 2012 - 2019
Projenin Bedeli	: 800.000 TL
İhale Bedeli	: -
Önceki Yıllar Harcaması	: 12.000 TL
2017 Yılı Ödeneđi	: 927.843 TL
2017 Yılı Harcaması	: 927.843 TL
Fiziki Gerçekleşmesi	: % 100
Projenin Son Durumu	: Tamamlandı

YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı	: Üskübü Melen Köprüsü (Akçakoca-Ereğli) Ayrımı-Düzce Yolunda
Projenin Yeri	: Düzce / Muhtelif
Başlama - Bitiş Tarihi	: 2015 - 2020
Projenin Bedeli	: 3.000.000 TL
İhale Bedeli	: -
Önceki Yıllar Harcaması	: 4.000 TL
2017 Yılı Ödeneği	: 2.750.000 TL
2017 Yılı Harcaması	: 2.750.000 TL
Fiziki Gerçekleşmesi	: % 92
Projenin Son Durumu	: Devam ediyor

YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı : Gümüşova - Gerede Otoyolu Deprem Kalıcı Konut Alanları Bağlantı Yolları Düzce Otoyol Bağlantı Yolu (İkmal İşinin Adı Gümüşova-Gerede Otoyolu İle D100 Üzeri Kervan Kavşağı Arası (4+270-8+500) Otoyol Bağlantı Yolu Yapım İşİ)

Projenin Yeri : Düzce / Merkez

Başlama - Bitiş Tarihi : 2016 - 2019

Projenin Bedeli : 104.650.000 (34.500.000+70.150.000) TL

İhale Bedeli : 39.619.530 TL

Önceki Yıllar Harcaması : 79.302.350 (29.761.261+49.541.089) TL

2017 Yılı Ödeneği : 22.000.000 TL

2017 Yılı Harcaması : 18.120.000 TL

Fiziki Gerçekleşmesi : % 33

Projenin Son Durumu : Proje yol uzunluğu 4,5 km BY BSK, 3 adet toplam uzunluğu 632 m ve 1 adet 46 m uzunluğunda köprü(Bolu Caddesi Köprüsü, Otogar Kavşağı Köprüsü, Darıcı Köyü Üstgeçidi ve Otoyol Kavşak Köprüsü) yer almaktadır. 2016 yılı sonu itibariyle Fore kazık ve dolgu çalışmaları yapılmıştır.

2018 yılında ikinci ihale bünyesinde çalışmalar sürdürülmektedir.



YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı : Anadolu Otoyolu'nun Abant Kavşağı - 1. Bölge Müd. Hud. Arası Muhtelif Km'lerde Üstyapı İyileştirilmesi ve Büyük Onarım Yapım İşi

Projenin Yeri : Bolu - Düzce

Başlama - Bitiş Tarihi : 2016 - 2017

Projenin Bedeli : 16.972.335 TL

İhale Bedeli : 11.820.232 TL

Önceki Yıllar Harcaması : 12.881.000 TL

2017 Yılı Ödeneği : 3.100.000 TL

2017 Yılı Harcaması : 4.091.000 TL

Fiziki Gerçekleşmesi : % 100

Projenin Son Durumu : Proje yol uzunluğu 28 km OY BSK' dır. 2016 yılında Bolu Dağı Tüneli ile Abant Kavşağı ve Bolu Dağı Tüneli ile Kaynaşlı Kavşağı arasında çalışmalara başlanmıştır. 2017 yılı Eylül ayı itibarı ile Düzce ili sınırlarındaki 11 Km' lik kesimin OY – BSK Onarımı tamamlanarak ihale sonlandırılmıştır. Kesin hesap çalışmaları devam etmektedir.



YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı : Anadolu Otoyolu Gerede Kavşağı-Karayolları 1.Böl. Müd. Hud. Arası Muhtelif Kesimler İle Kavşak Kolları ve Bağlantı Yollarında Üstyapı İyileştirmesi

Projenin Yeri : Bolu - Düzce

Başlama - Bitiş Tarihi : 2017 - 2018

Projenin Bedeli : 54.000.000 TL

İhale Bedeli : 38.105.070 TL

Önceki Yıllar Harcaması : -

2017 Yılı Ödeneği : 1.000.000 TL

2017 Yılı Harcaması : 34.375.000 TL

Fiziki Gerçekleşmesi : %64

Projenin Son Durumu : Anadolu Otoyolu Bolu ili Gerede Kavşağı ile Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Hududu arası Otoyol BSK onarımı ihalesindeki proje yol uzunluğu muhtelif kesimlerde 19 Km Otoyol BSK onarımıdır.

2017 yılı sonu itibarı ile Düzce ili sınırlarında 9 Km OY BSK tamamlanmış olup çalışmalar devam etmektedir.



YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı : **Gümüşova-Gerede Otoyolu'nda Düzce Kavşağı(Km:8+738) ve Kaynaşlı Kavşağında(Km: 29+570) Kavşak Kolu Genişletilmesi, Köprülü Kavşak Yapılması İşi**

Projenin Yeri : Düzce Merkez - Gölyaka

Başlama - Bitiş Tarihi : 2017 - 2018

Projenin Bedeli : 27.000.000 TL

İhale Bedeli : 20.087.765 TL

Önceki Yıllar Harcaması : -

2017 Yılı Ödeneği : 1.000.000 TL

2017 Yılı Harcaması : -

Fiziki Gerçekleşmesi : -

Projenin Son Durumu : Proje yol uzunluğu 3 Km BY BSK Bağlantı Yolu, 2 adet Köprülü Kavşak yapımı ile Gölyaka ve Düzce Kavşaklarında köprü genişletmesinden oluşmaktadır. 2018 yılında projenin tamamlanması planlanmaktadır.
