

DÜZCE

TEİAŞ 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ADAPAZARI)

2017 YILI YATIRIMLARI (10 Proje)

2018

SIRA NO	PROJE ADI
1.	Gümüřova TM
2.	Düzce OSB TM
3.	(Osmanca – Hendek) Brř. Gümüřova TM EİH.
4.	380 kV Osmanca-Adapazarı EİH. (Yenileme)
5.	(Osmanca-Kaynařlı) Brř. N-Düzce OSB EİH.
6.	154 kV Osmanca-Adapazarı EİH. (Yenileme)
7.	380 kV Akçakoca-Karasu-Çekmeköy E.İ.H.
8.	380 kV Bartın OSB-Akçakoca EİH.
9.	Osmanca TM Tevsiat
10.	380 kV Osmanca-Ada 2 DGKÇS EİH

YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı : Gümüşova TM

Projenin Yeri : Düzce / Gümüşova

Başlama - Bitiş Tarihi : 2009 - 2018

Projenin Bedeli : 8.800.000 TL

İhale Bedeli : -


Önceki Yıllar Harcaması : 2.000 TL

2017 Yılı Ödeneği : 2.000 TL

2017 Yılı Harcaması : -

Fiziki Gerçekleşmesi : -

Projenin Son Durumu : Kapsam kontrol listesi Trafo Merkezleri Tesis Dairesi Başkanlığına gönderildi.

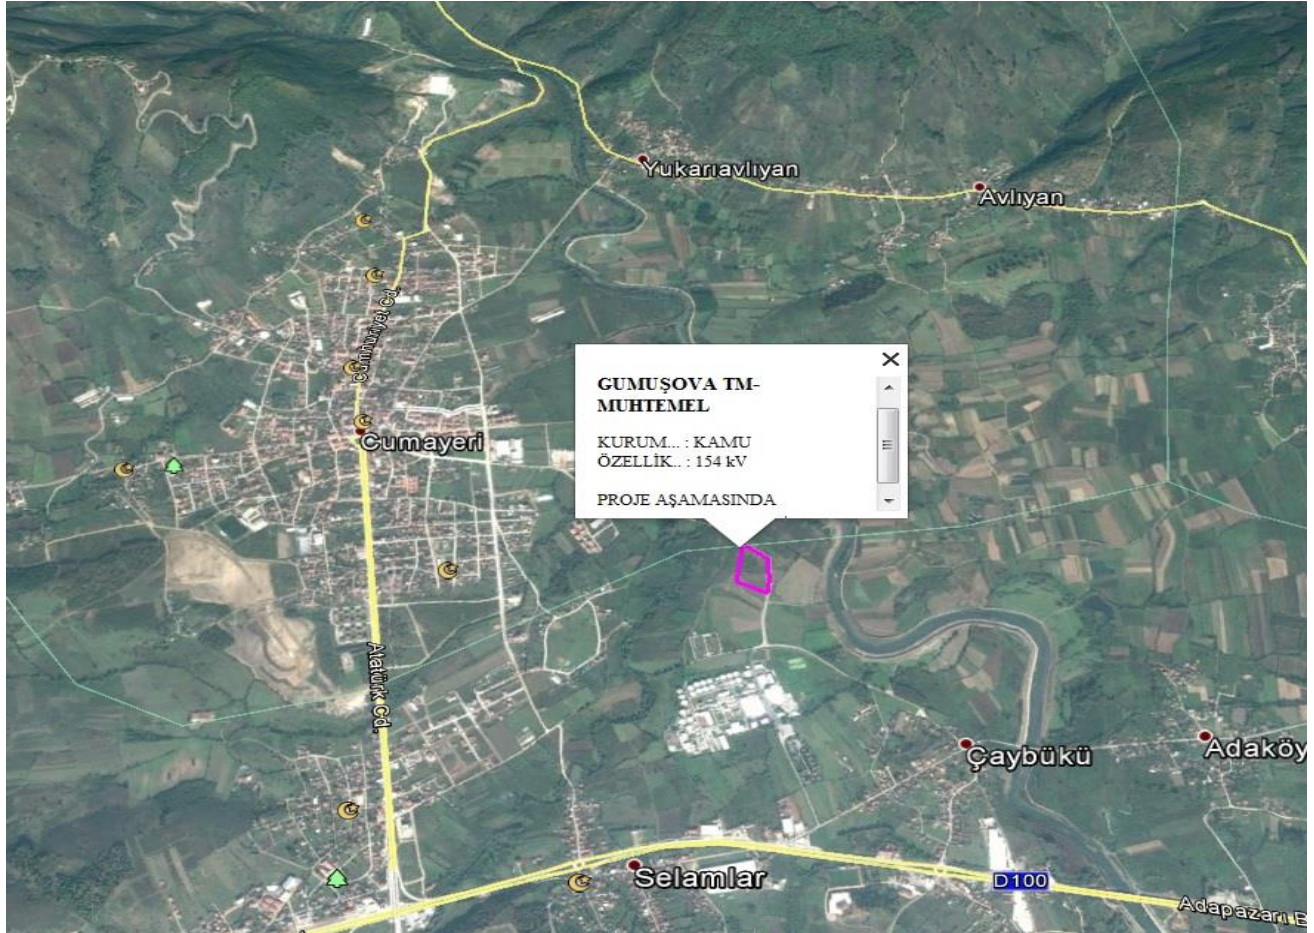

YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı : Düzce OSB TM

Projenin Yeri : Düzce / Merkez

Başlama - Bitiş Tarihi : 2016 - 2018

Projenin Bedeli : 10.000.000 TL

İhale Bedeli : -


Önceki Yıllar Harcaması : 2.000 TL

2017 Yılı Ödeneği : 1.500.000 TL

2017 Yılı Harcaması : 1.234.000 TL

Fiziki Gerçekleşmesi : % 5

Projenin Son Durumu : İhaleyi alan MARDİVA firması ile 13.09.2017 tarihinde sözleşme imzalandı. Çevre istinat duvarı, kumanda binası ve trafo temellerinde çalışmalar devam ediyor.

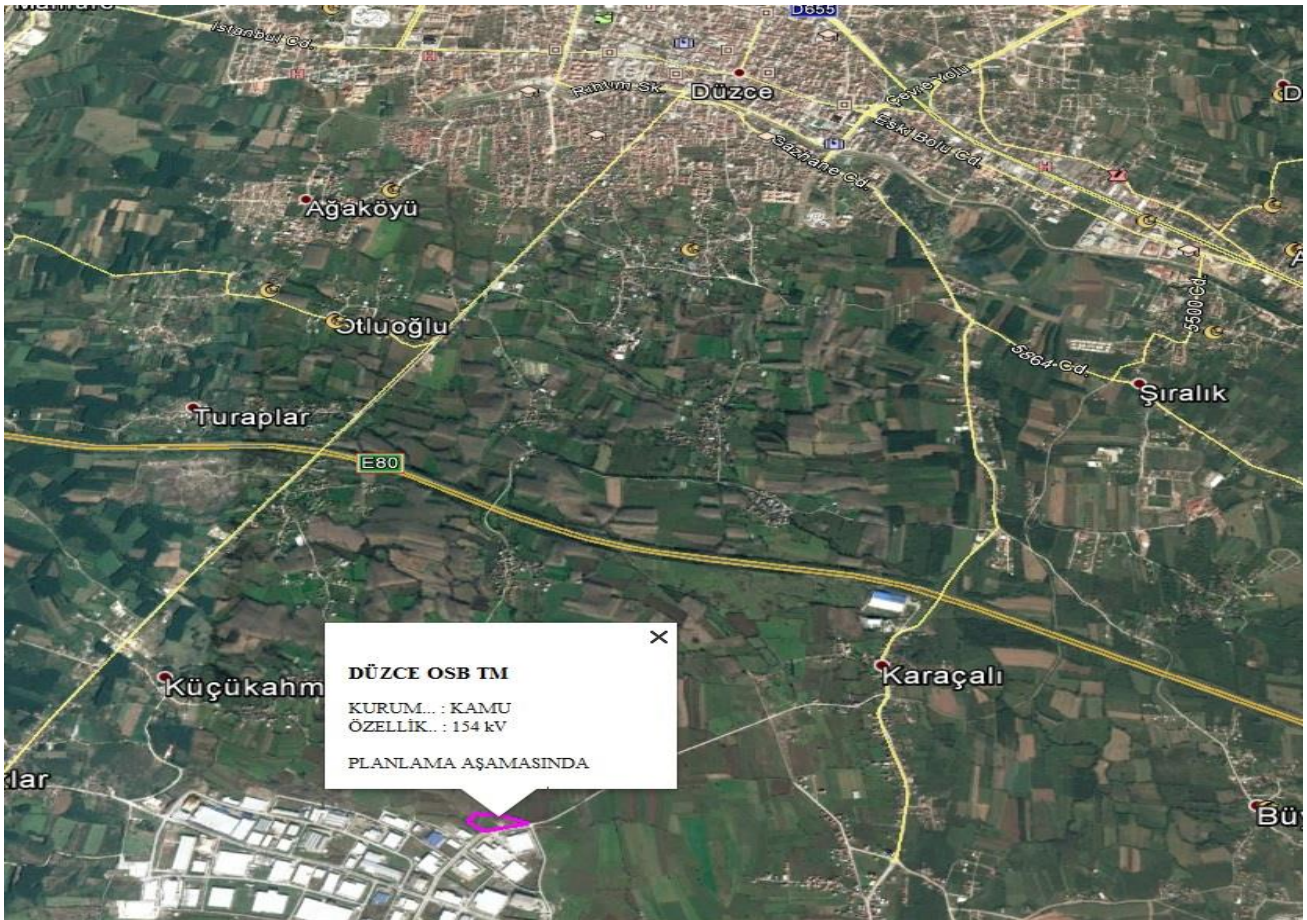

YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı : (Osmanca – Hendek) Brş. Gümüşova TM EİH.

Projenin Yeri : Düzce / Muhtelif

Başlama - Bitiş Tarihi : 2009 - 2017

Projenin Bedeli : 300.000 TL

İhale Bedeli : -

Önceki Yıllar Harcaması : 5.000 TL

2017 Yılı Ödeneği : 295.000 TL

2017 Yılı Harcaması : -

Fiziki Gerçekleşmesi : -

Projenin Son Durumu : Hazırlanan planlar Sakarya Kadastro Müdürlüğüne onaylanmıştır. Hattın geri kalan bölümünün kamulaştırma planları tekrar yapılacaktır.



YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı : 380 kV Osmanca-Adapazarı EİH. (Yenileme)

Projenin Yeri : Düzce / Muhtelif

Başlama - Bitiş Tarihi : 2015 - 2020

Projenin Bedeli : 52.000.000 TL

İhale Bedeli : -


Önceki Yıllar Harcaması : 10.000 TL

2017 Yılı Ödeneği : 2.000 TL

2017 Yılı Harcaması : -

Fiziki Gerçekleşmesi : -

Projenin Son Durumu : Hazırlanan planlar Sakarya Kadastro Müdürlüğüne onaylanmıştır. Hattın geri kalan bölümünün kamulaştırma planları tekrar yapılacaktır.

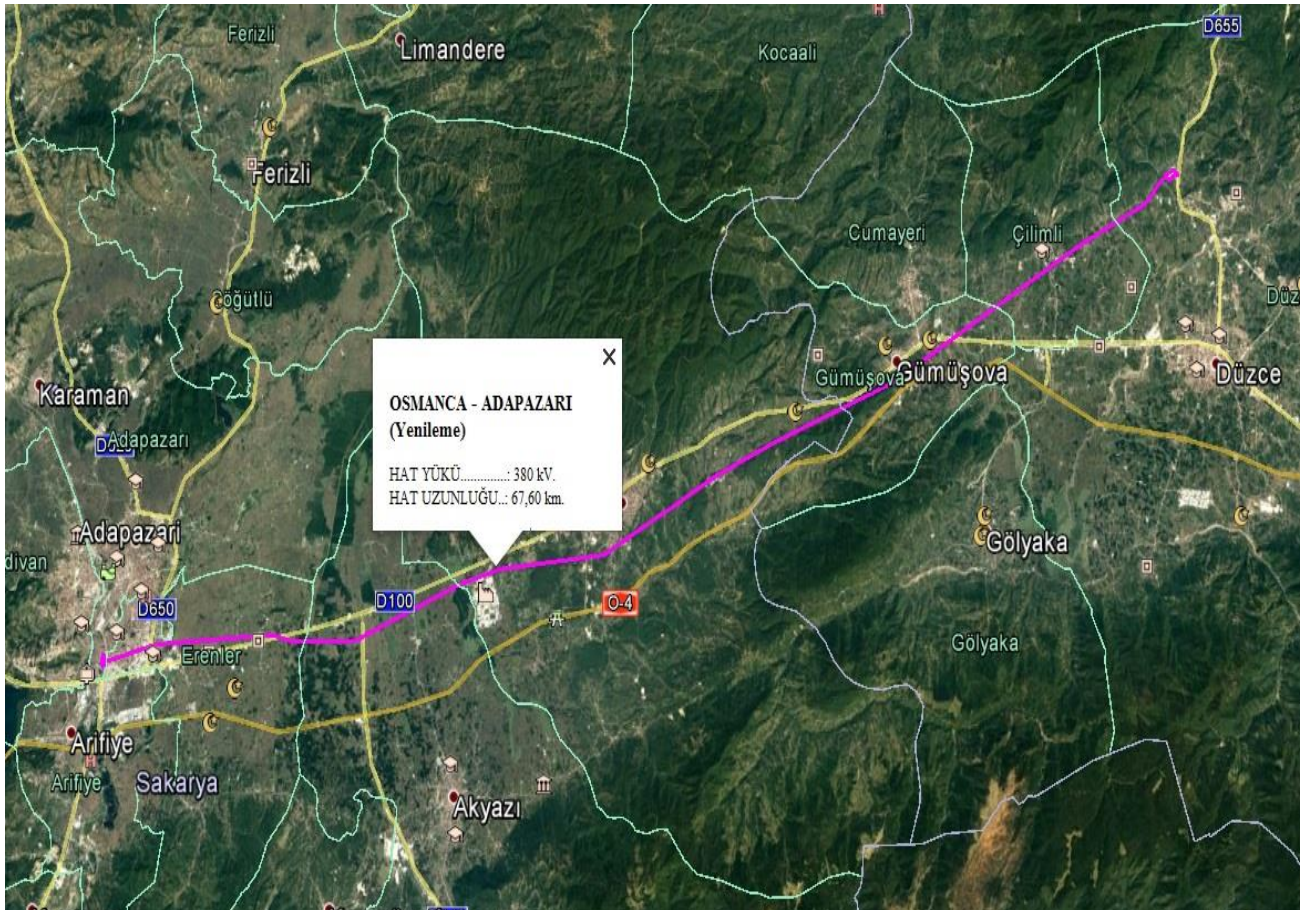

YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı : (Osmanca-Kaynaşlı) Brş. N-Düzce OSB EİH.

Projenin Yeri : Düzce / Muhtelif

Başlama - Bitiş Tarihi : 2016-2018

Projenin Bedeli : 5.400.000 TL

İhale Bedeli : 4.749.916 TL


Önceki Yıllar Harcaması : 2.000 TL

2017 Yılı Ödeneği : 5.279.000 TL

2017 Yılı Harcaması : 5.279.000 TL

Fiziki Gerçekleşmesi : % 100

Projenin Son Durumu : 26.11.2017 tarihinde geçici kabulü yapıldı.

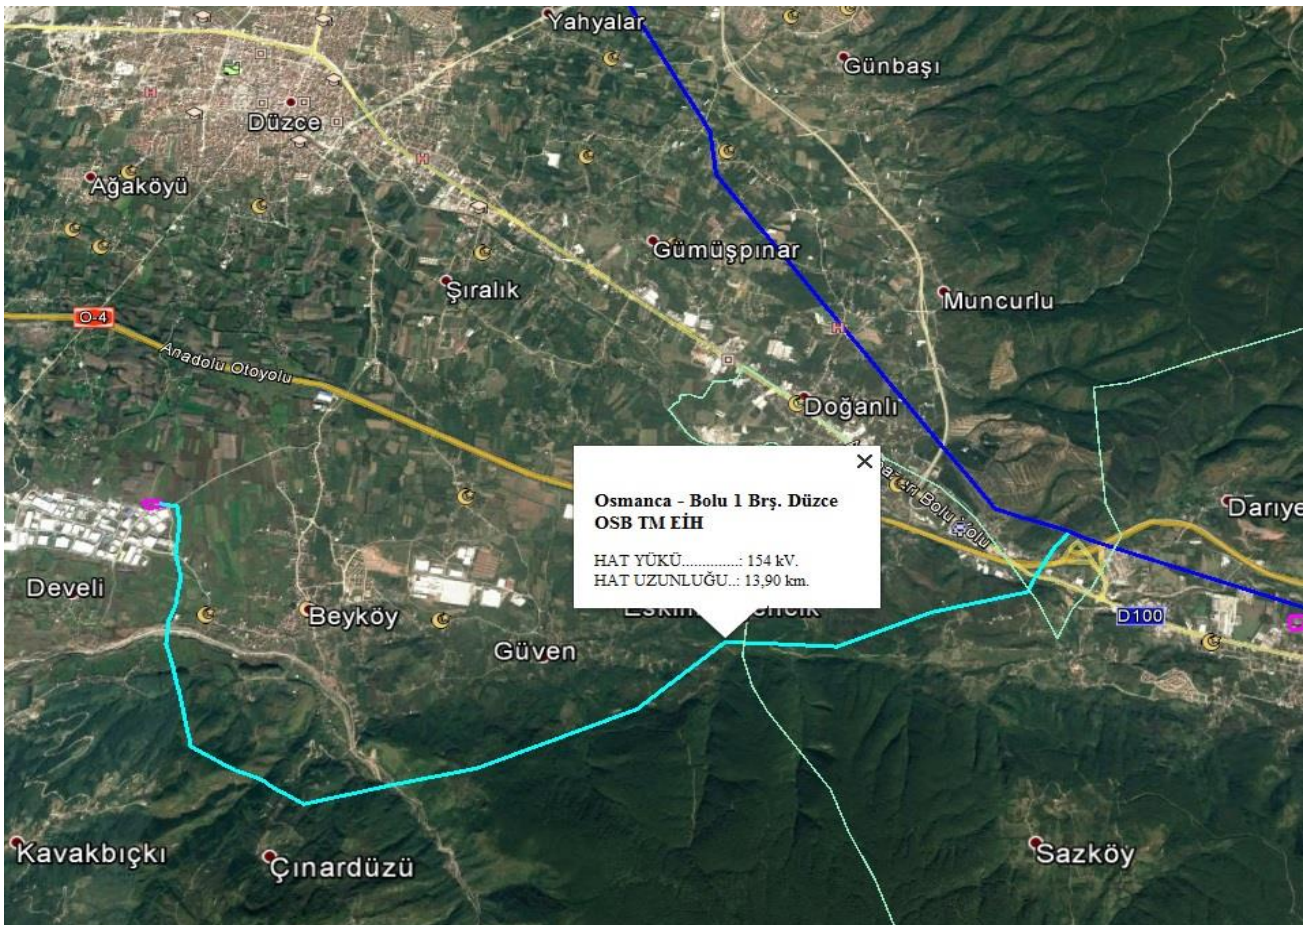

YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı : 154 kV Osmanca-Adapazarı EİH. (Yenileme)

Projenin Yeri : Düzce / Muhtelif

Başlama - Bitiş Tarihi : 2017 - 2019

Projenin Bedeli : 19.000.000 TL

İhale Bedeli : -


Önceki Yıllar Harcaması : -

2017 Yılı Ödeneği : 1.900.000 TL

2017 Yılı Harcaması : -


Fiziki Gerçekleşmesi : -

Projenin Son Durumu : 02.05.2017 tarihinde kamulaştırma ihalesi yapılmıştır. Planlar Sakarya, Akyazı ve Hendek Kadastro Müdürlüklerine sunulmuştur.

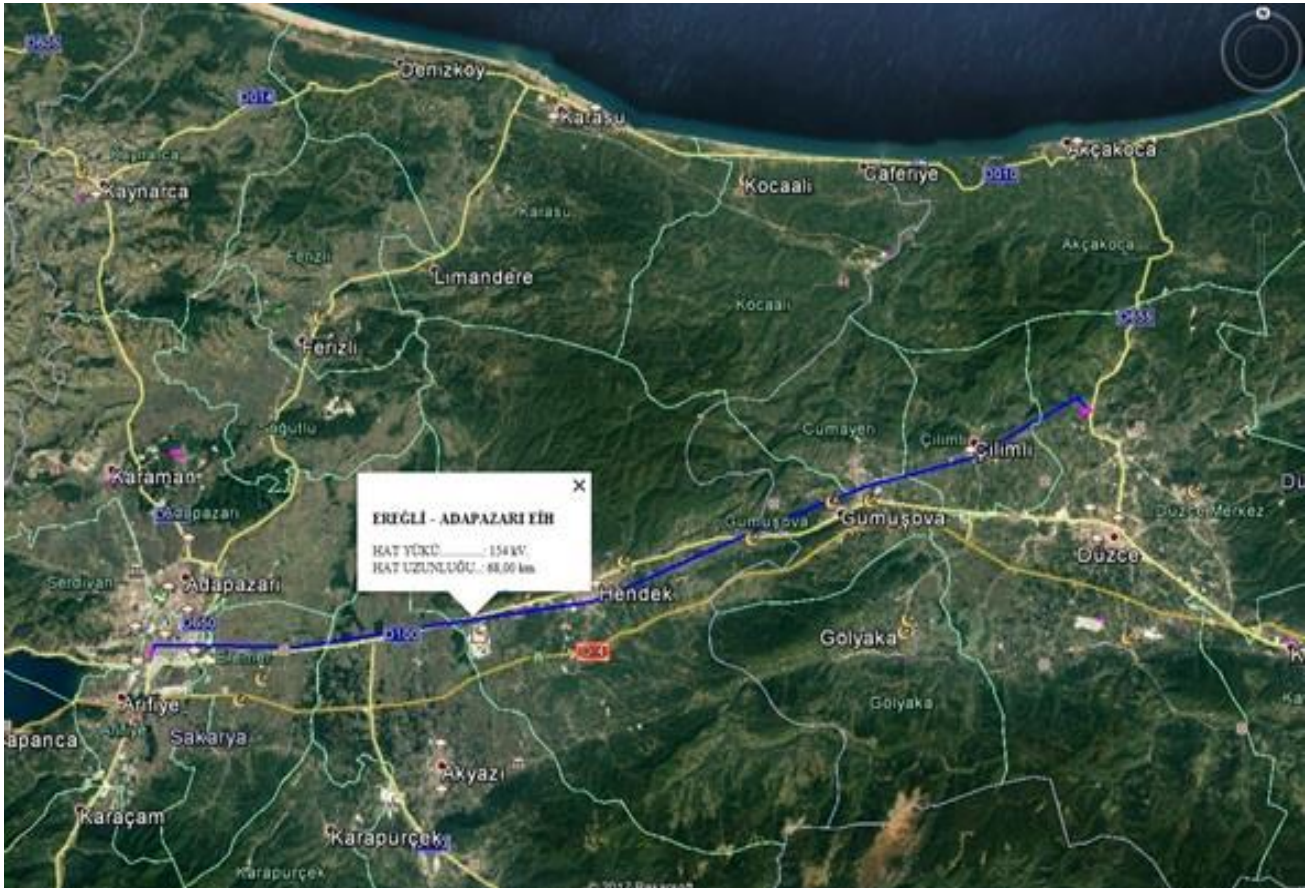


YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı	: 380 kV Akçakoca-Karasu-Çekmeköy E.İ.H.
Projenin Yeri	: Düzce-Sakarya-Kocaeli-İstanbul
Başlama - Bitiş Tarihi	: 2017 - 2020
Projenin Bedeli	: 130.000.000 TL
İhale Bedeli	: -
Önceki Yıllar Harcaması	: -
2017 Yılı Ödeneği	: 13.000.000 TL
2017 Yılı Harcaması	: -
Fiziki Gerçekleşmesi	: -
Projenin Son Durumu	: Kamulaştırma planları yapım işi ELTEMTEK'e verilmiştir.

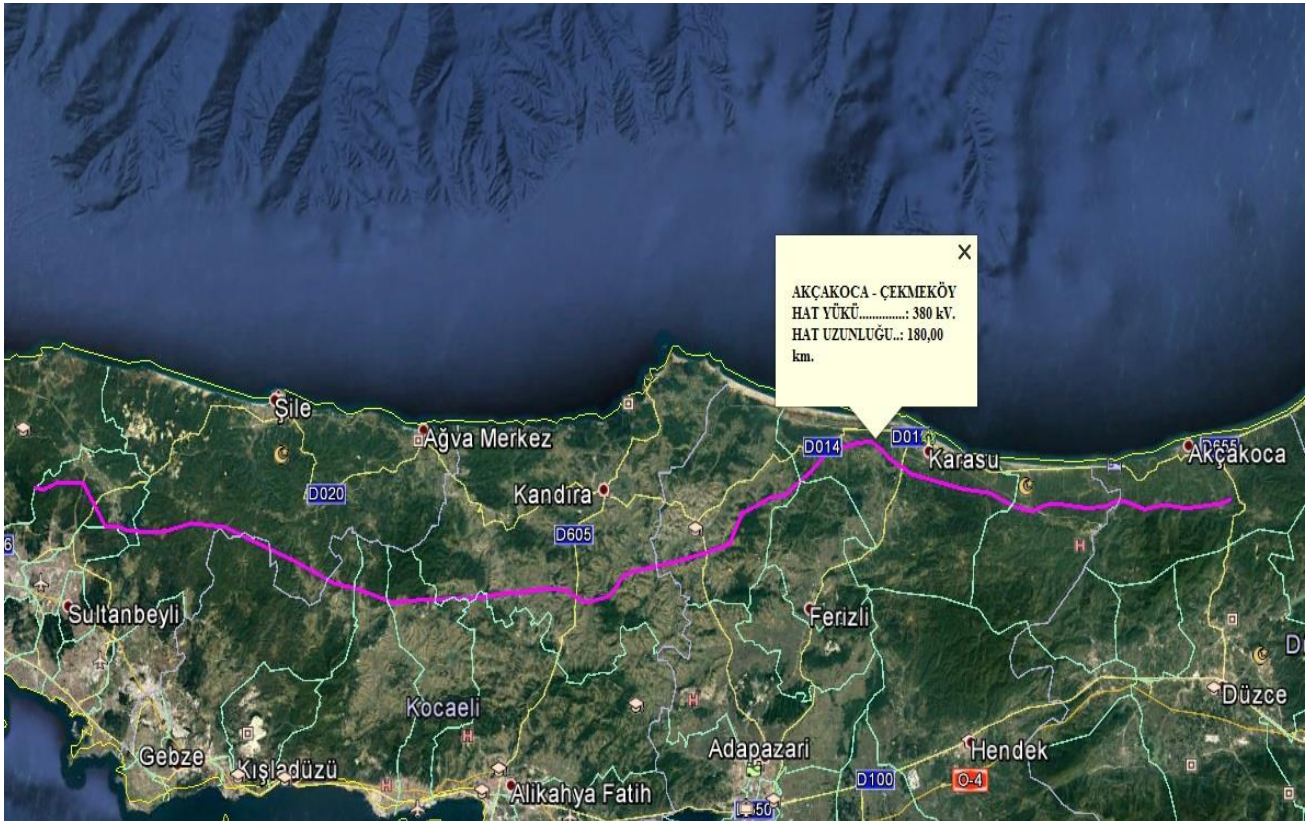

YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı	: 380 kV Bartın OSB-Akçakoca EİH.
Projenin Yeri	: Bartın-Düzce
Başlama - Bitiş Tarihi	: 2017 - 2020
Projenin Bedeli	: 98.000.000 TL
İhale Bedeli	: -
Önceki Yıllar Harcaması	: -
2017 Yılı Ödeneği	: 9.800.000 TL
2017 Yılı Harcaması	: -
Fiziki Gerçekleşmesi	: -
Projenin Son Durumu	: Kamulaştırma planları yapım işi ELTEMTEK'e verilmiştir.

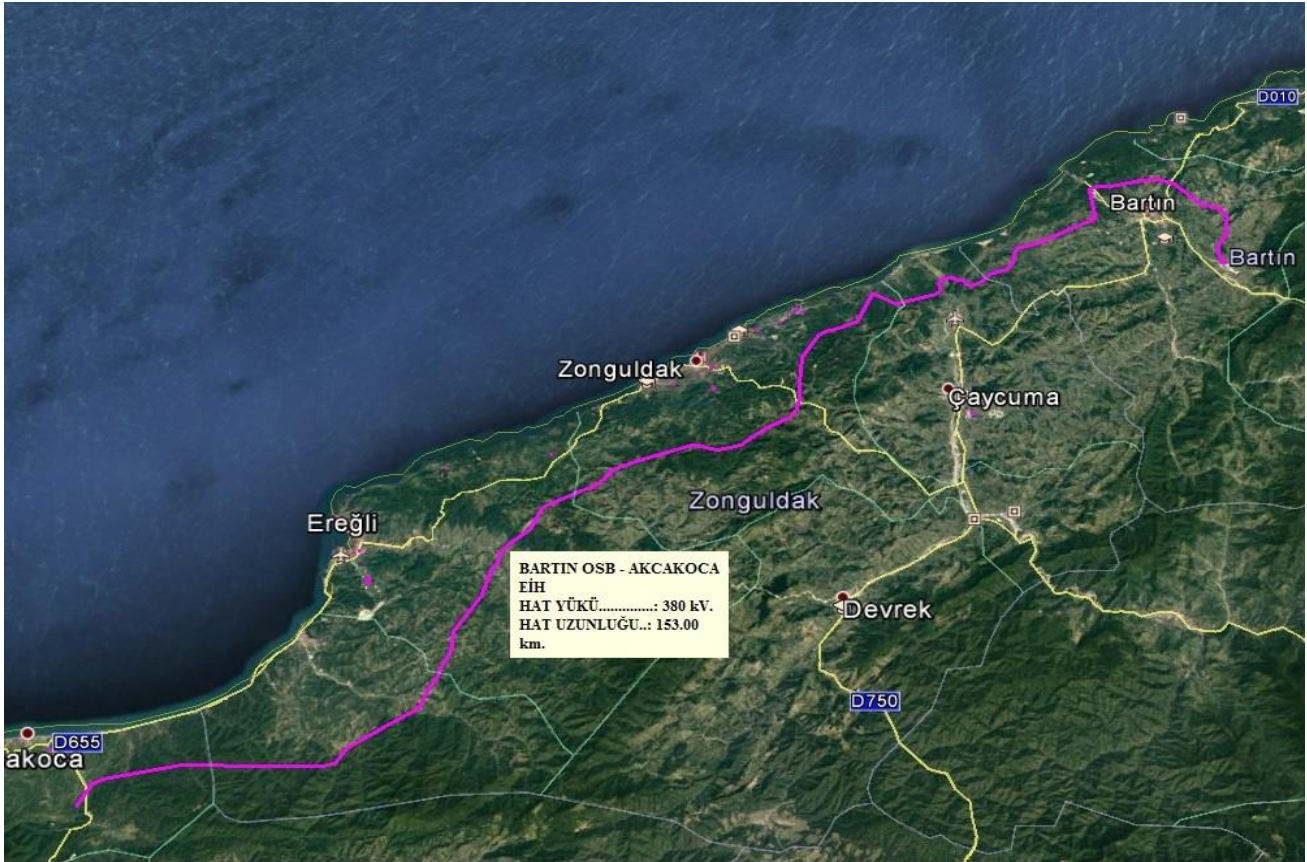

YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı	: Osmanca TM Tevsiat
Projenin Yeri	: Düzce / Merkez
Başlama - Bitiş Tarihi	: 2011 - 2015
Projenin Bedeli	: 6.000.000 TL
İhale Bedeli	: 5.663.427 TL
Önceki Yıllar Harcaması	: -
2017 Yılı Ödeneği	: -
2017 Yılı Harcaması	: -
Fiziki Gerçekleşmesi	: % 100
Projenin Son Durumu	: Projenin 05.08.2015 tarihinde geçici kabulü yapıldı.



YATIRIM BİLGİ FORMU

Projenin Adı	: 380 kV Osmanca-Ada 2 DGKÇS EİH
Projenin Yeri	: Düzce / Muhtelif
Başlama - Bitiş Tarihi	: 2010 - 2016
Projenin Bedeli	: 55.000.000 TL
İhale Bedeli	: 16.911.973 USD
Önceki Yıllar Harcaması	: -
2017 Yılı Ödeneği	: -
2017 Yılı Harcaması	: -
Fiziki Gerçekleşmesi	: % 100
Projenin Son Durumu	: 29.07.2016 tarihinde geçici kabulü yapıldı.

